Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ



# ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПРР 2014-2020 Г.

гр. София

14 ноември 2025 г.


www.bgregio.eu

www.bgregio.eu

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

# БЮДЖЕТ И ДОГОВАРЯНЕ НА ОПРР 2014-2020

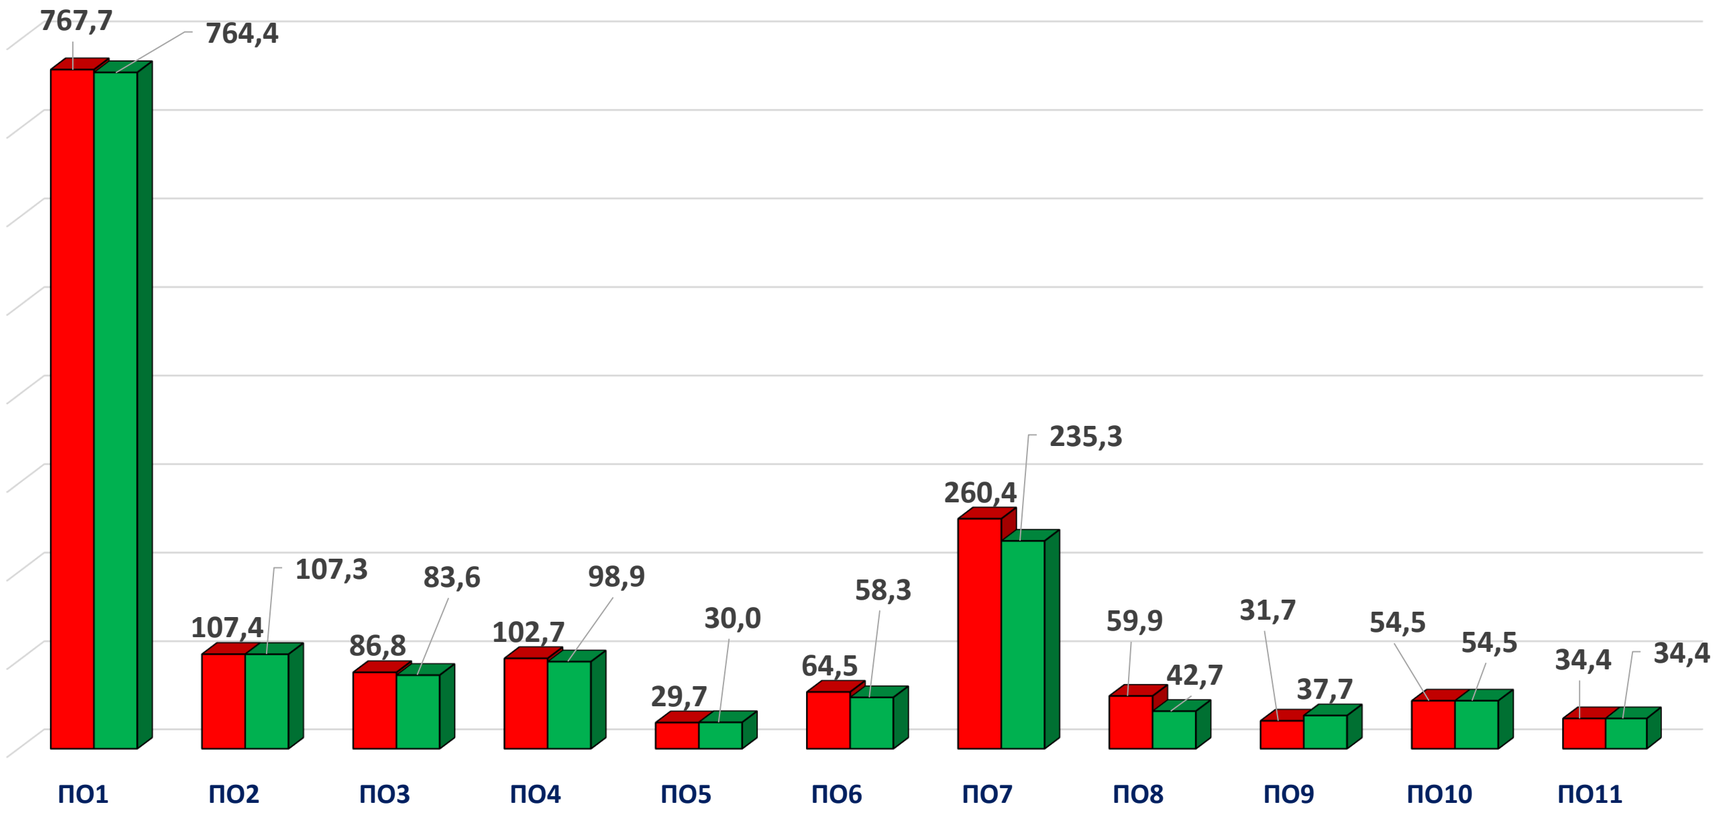


www.bgregio.eu

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

# БРОЙ ПРОЕКТИ ПО ОПРР 2014-2020 – 800

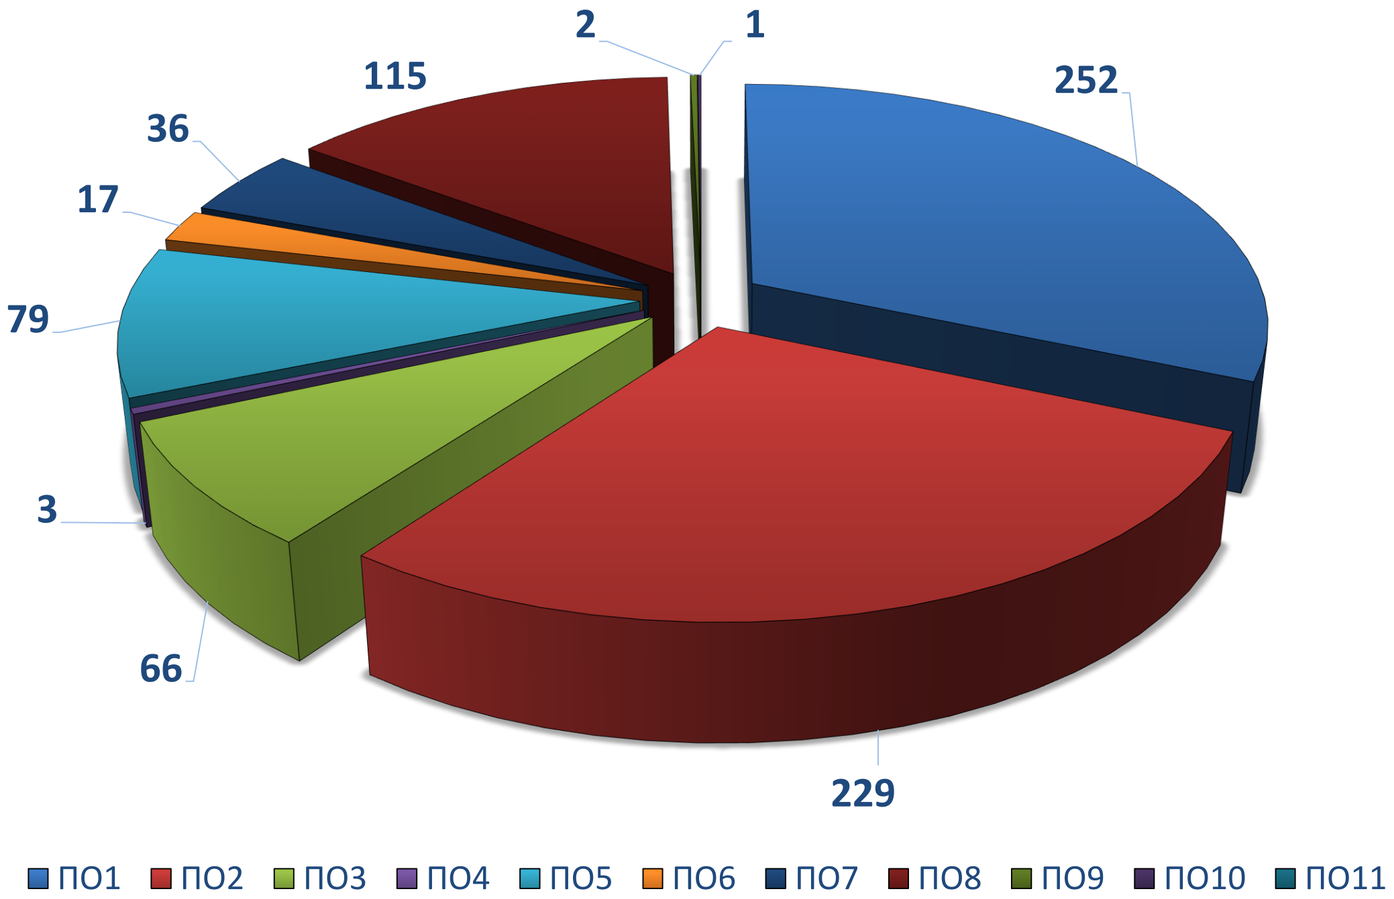


www.bgregio.eu

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

# ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРР 2014-2020

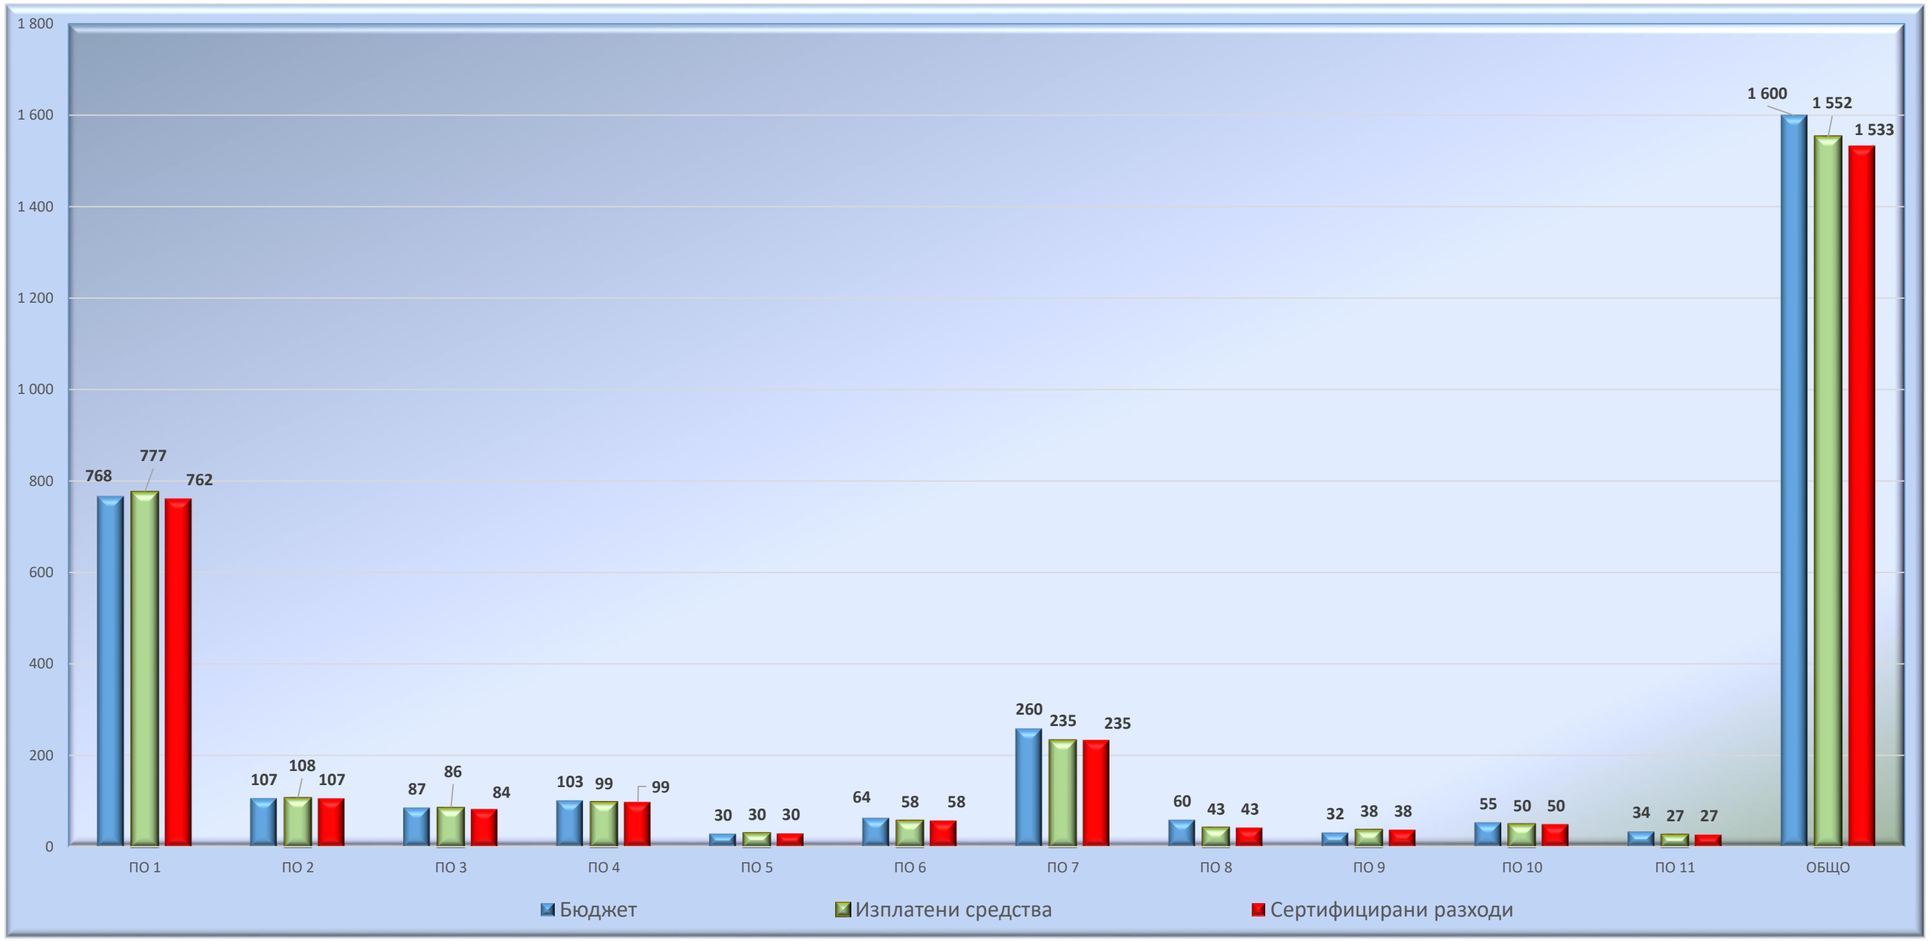



Съфинансирано от Европейския съюз



ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ



# РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРР 2014-2020

| ПО | Индикатори | Постигната стойност | Крайна цел 2023 г. | % на постигане |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (kWh/година) | 30 095 302,33 | **17 636 242,00** | 170,6% |
| | Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (лица) | 127 676 | **118 794** | 107,5% |
| | Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м) | 6 168 425,42 | **3 976 567,40** | 155,1% |
| | Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони (кв. м) | 162 025,11 | **88 039,44** | 184,0% |
| | Рехабилитирани жилища в градските райони | 854 | **632** | 135,1% |
| | Население, ползващо подобрени социални услуги (лица) | 102 312 | **12 841** | 796,8% |
| | **Сертифицирани средства (евро)** | **762 347 417,68** | **767 703 870** | 99,3% |
| 2 | Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (kWh/година) | 72 639 504,30 | **62 311 875,00** | 116,6% |
| | **Сертифицирани средства (евро)** | **106 862 450,40** | **107 418 046** | 99,5% |
| 3 | Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (лица) | 129 354 | **98 277** | 131,6% |
| | **Сертифицирани средства (евро)** | **83 506 616,89** | **86 775 155** | 96,2% |
| 4 | Одобряване на голям проект със започване на строителните работи и доставките за някои от инвестициите | 1 | **1** | 100,0% |
| | Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки) | 369 | **359** | 102,8% |
| | **Сертифицирани средства (евро)** | **98 925 812,37** | **102 715 625** | 96,3% |
| 5 | Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процес на деинституционализация | 183 | **148** | 123,6% |
| | **Сертифицирани средства (евро)** | **29 999 192,87** | **29 712 538** | 101,0% |
| 6 | Създаване на финансов инструмент за развитие на туризма. Разработен механизъм за съчетаване на подкрепата чрез ФИ и безвъзмездни средства. Започнали строителни работи за някои от инвестициите | 1 | **1** | 100,0% |
| | **Сертифицирани средства (евро)** | **58 316 881,07** | **64 482 246** | 90,4% |
| 7 | Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища (километри) | 611,04 | **649** | 94,2% |
| | **Сертифицирани средства (евро)** | **235 224 037,81** | **260 383 976** | 90,3% |

# ТРУДНОСТИ, ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ

1. Инфлация и икономическа криза - повишаване на цените в строителството, необходимост от допълнителен финансов ресурс:
   - Методика за индексиране на разходите по договори за обществени поръчки за строителство;
   - Изменение на договори за обществена поръчка за строителство на основание чл. 117а от Закона за обществените поръчки;
   - Указания за увеличаване размера на БФП по ОПРР на основание индексиране на разходите по договори с изпълнители;
   - Указания относно възможностите за увеличаване размера на БФП по ОПРР при договори, непопадащи в обхвата на Методиката;
   - Решение на Министерския съвет за даване съгласие УО на ОПРР да сключва/изменя ДБФП в размер до 10 на сто над определения бюджет по оперативната програма – наддоговаряне.

# ТРУДНОСТИ, ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ

2. Забавяване на изпълнение и приключване на договорите за БФП в резултат на външните фактори в края на програмния период – COVID, икономическа и финансова криза, инфлация, растежа на цени в строителството:

- ✓ Процедура за двуетапно отчитане на неприключените проекти;
- ✓ УО на ОПРР идентифицира проекти, които не могат да бъдат завършени в рамките на допустимостта на разходите по програмата;
- ✓ Сключени анекси за двуетапно докладване, за да се предостави допълнително време на бенефициерите да приключат дейностите със собствени средства;
- ✓ За 37 проекта е въведено двуетапно отчитане със стойност над 1 млн. евро;
  - ✓ 1 ви етап - окончателно плащане най-късно до 15.01.2024 г.;
  - ✓ Втори етап - последващо техническо отчитане най-късно до 31.07.2025 г. за приключване на дейностите;
- ✓ Част от проектите не са изпълнени в срок за двуетапно отчитане и се включват в Приложение II за неактивни проекти.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

# ПРИЛОЖЕНИЕ II – НЕАКТИВНИ ПРОЕКТИ

- ✓ **3 проекта на Министерство на образованието и науката** за обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура:
  - ➢ Изпълнени са 28 от общо 34 обекта на интервенция;
  - ➢ За останлите обекти има договори с изпълнители и са в процес на изпълнение;
  - ➢ Договорите с МОН са удължени до 30.09.2026 г.
- ✓ **Проект BG16RFOP001-4.001-0001-C05 Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ**:
  - ➢ Завършени са 121 от 237 обекта;
  - ➢ Доставени са 398 от 400 санитарни превозни средства;
  - ➢ Краен срок 31.10.2026 г.
- ✓ **BG16RFOP001-5.001-0003-C06 Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания** на Министерство на на здравеопазването
  - ➢ Завършени и функциониращи са 2 от 14 обекта;
  - ➢ Краен срок 31.10.2026 г.
- ✓ **BG16RFOP001-1.001-0008-C08 Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“ район** „Оборище на Столична община:
  - ➢ Дейностите за СМР по проекта са изпълнени и е издаден акт обр. 15 за приемане годността на строежа;
  - ➢ Предстои обектът на интервенция да бъде въведен в експлоатация;
  - ➢ Договорът е удължен до 19.12.2025 г.
- ✓ **BG16RFOP001-6.002-0016-C09 Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика” и прилежащи некрополи** на Община Петрич:
  - ➢ Строително-монтажните работи на обектите са приключили и са издадени акт обр. 15 за приемане годността на строежа;
  - ➢ В процес на изпълнение е доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, финансов одит и информация и публичност;
  - ➢ Договорът е удължен до 15.01.2026 г.

❖ При приключване на последните 2 проекта до финалното изпращане на окончателния доклад (15.02.26 г.), същите ще бъде изключени от Приложение II.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

# СИГНАЛИ И НЕРЕДНОСТИ

През периода УО на ОПРР е осъществил предварителен контрол преди верификация на процедури за обществени поръчки за законосъобразно възлагане на договори - 3827 бр.

**Регистрирани сигнали за нередност – общо 2546 бр., от които:**

- ✓ приключили с установяване на нередност и налагане на финансови корекции – 2178 бр.;
- ✓ приключили с прекратяване, поради липса на установено нарушение – 336 бр.;
- ✓ сигнали със статус „Спрян“, анулиран – 29 бр.;
- ✓ в обработка (в процедура по чл. 73 от ЗУСЕФСУ) – 3 бр.

# СИГНАЛИ И НЕРЕДНОСТИ

До дирекция АФКОС са докладвани:

- установени нередности – общо 2178 бр., от които:
  - нередности, докладвани до ОЛАФ – 695 бр.;
  - изключения от докладване до ОЛАФ – 122 бр.;
  - неподлежащи на докладване до ОЛАФ – 1361 бр.;

**Образувани административни дела срещу Индивидуални административни актове на РУО на ОПРР за определяне на финансови корекции и по отказ от верификация – 1524 бр.**

С окончателно влязло в сила съдебно решение са постановени общо – 1380 бр. от които:

- в полза на РУО на ОПРР – 1015 бр.;
- в полза на бенефициента – 365 бр,;
- неприключили съдебни производства – 144 бр.

www.bgregio.eu

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

# РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ




**ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ НА ОПРР 2014-2020 Г. ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД СА ПРОВЕДЕНИ:**

- **209 СЪБИТИЯ – ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, ГОДИШНИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ОПРР, ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ, РАБОТНИ СРЕЩИ, СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ И ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ;**

- **АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПУБЛИКУВА НА САЙТА НА ПРОГРАМАТА – WWW.BGREGIO.EU И НА ЕДИННИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ – WWW.EUFUNDS.BG.**



# ОЦЕНКИ

## НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ОЦЕНКА

- В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД, ПЛАНЪТ ЗА ОЦЕНКА НА ОПРР 2014-2020 Е ПРОМЕНЯН ЧЕТИРИ ПЪТИ.

СЪГЛАСНО 4-ТОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ОЦЕНКА ОТ М. НОЕМВРИ 2022 Г. В НЕГОВИЯ ОБХВАТ ПОПАДА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ТРИ ОЦЕНКИ:

- ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОПРР 2014-2020;
- ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г.;
- ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г.

www.bgregio.eu

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

# НАПРЕДЪК В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И НА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ

ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ОБЩО 1525 СЛУЖИТЕЛИ (ЦИФРАТА Е ОБЩА И ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ЦЕЛИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД) НА УО НА ОПРР СА ПРЕМИНАЛИ 445 ОБУЧЕНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ ЕФЕКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ФУНКЦИИ.

www.bgregio.eu

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

# ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ



КН ОДОБРЯВА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРР 2014 – 2020 И ДАВА МАНДАТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ДА СЕ НАПРАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ПРОМЕНИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА НАПРАВЕНИТЕ КОМЕНТАРИ ОТ ОДИТИРАЩИЯ И СЕРТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН, ВКЛ. И ОТ СТРАНА НА ЕК И ДА ИЗПРАТИ ФИНАЛНИЯ ВАРИАНТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСОКИТЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ В СРОК ДО 15.02.2026 г.

www.bgregio.eu

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

# БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

## 9-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ПРР 2021-2027 Г.

